12/30

KANTON SOLOTHURN GEMEINDE LOMMISWIL

GESTALTUNGSPLAN

KIESGRUBE LOMMISWIL

GB LOMMISWIL NR. 261-265,267,293-294

Abbauplan

HÖHENKURVEN VOM URSPRÜNGLICH BEST. TERRAIN

ABBAUETAPPEN

GRUBENERSCHLIESSUNG UND FLURWEGNETZ ZU BEGINN DER ABBAUETAPPE 1

Situation 1:1000

PLAN NR. 309.642.1	PROJEKTVERFASSER
FORMAT 85 / 138	ZETTER AG RUDOLF ENGGIST DIPL. ING. ETH / SIA RÖTISTRASSE 22 4500 SOLOTHURN 065 22 32 48
DATUM 12. SEPT. 1984	ERWIN HUG FRIEDERICH RAMSER INGENIEURBUREAU SIA GRUBENWEG 19 2540 GRENCHEN 065 52 29 12
REV. 1. SEPT. 1986	

OEFFENTLICH AUFGELEGEN VOM 15. OKTOBER 1984 BIS 15. NOVEMBER 1984

GENEHMIGT VOM EINWOHNERGEMEINDERAT
AM 27. SEPTEMBER 1984

DER AMMANN: DER GEMEINDESCHREIBER

GENEHMIGT VOM REGIERUNGSRAT MIT BESCHLUSS NR 2020
VOM 1. JULI 1986

DER STAATSSCHREIBER:

LEGENDE:

- Geltungsbereich
- best. Grube "Zetter"
- Wald

Abbaugebiete

- Firma Erwin Hug
- Firma Zetter AG

Konzessionsfläche	Der Kiesabbau erfolgt durch
Surbaumacker GB-Nr. 267	Firma Erwin Hug Bauunternehmung, Seltach
Neumatt, Rainacker und Matschenland GB-Nrn. 261, 262, 263, 264 265, 293, 294	Firma Zetter AG Bauunternehmung, Solothurn

Etappen Kiesabbau

- (4) Firma Erwin Hug
- (3) Firma Zetter AG

Der Kiesabbau erfolgt durch beide Unternehmer gemeinsam auf den jeweiligen Konzessionsflächen.
Er wird mit Hilfe der für beide Unternehmer vg. mengenmässigen Abbau- und Wiederauffüllungs-etappen örtlich und zeitlich koordiniert.
Die Abbaumenge pro Etappe und Firma beträgt ca. 125.000 - 150.000m³

Erschliessung

- bestehende Kiestransportstrasse
- Transportpisten für Grubenerschliessung
- Flurwege im Bereich des Kiesabbaugebietes, diese werden während dem Abbau unterbrochen oder verlegt.

Damit die Erschliessung des Kulturlandes jederzeit gewährleistet ist, werden vor Beginn des Kiesabbaues der ersten Etappe folgende Bauarbeiten durch beide Firmen gemeinsam durchgeführt:

- Ausbau best. Flurweg (HMT 30cm stark und CB 10/15)

best. Hochspannungsleitung

- noch Weisungen der AEK durch Firma Zetter AG gemäss Phasenplan II verlegen

Geltungsbereich Teil-Genehmigung November 1996

Beschlossen vom Einwohnergemeinderat
am: 15. Jan. 1997
Der Gemeindepräsident: A. von Burg
Der Gemeindeschreiber: C. Pfeffer

Genehmigt vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 2623
vom 12 November 1996
Der Staatsschreiber: Dr. K. Schwaller

Bestandteile des Gestaltungsplanes Kiesgrube Lommiswil sind:

Abbauplan	Nr. 309.642.1
3 Phasenpläne	Nr. 309.642.2 - I
	Nr. 309.642.2 - II
	Nr. 309.642.2 - III
Endgestaltungsplan	Nr. 309.642.3
Sonderbauvorschriften	
Datum dieses Gestaltungsplanes:	12. September 1984 (Auflageplan) 1. September 1986 (Rev. gem. RRB)

SCHNITT D-D

SCHNITT A-A



SCHNITT B-B



SCHNITT C-C



Böschungen und Sicherheitsabstände
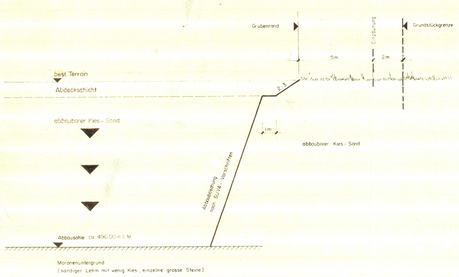
- während Kiesabbau
